四川省数字政府项目 · 作战指挥驾驶舱

数据源：作战图数据底盘.xlsx（自动读取）　数据时点 2027-01-15　数据时点 01/15/2027　示例数据　载入数据　刷新

1 项目总体健康度

判定口径：偏差=实际−计划｜≥0 正常 · −1~−15 预警 · <−15 延期



按计划应完成 **39%**｜已填报 39/39 项

项目健康度判定

轻度滞后


实际进度 **33%**，按计划应完成 39%，滞后 **6** 个百分点，处于预警区间。

任务总数	已完成	延期	预警	未填报	偏差
39 项	0 项	7 项	15 项	0 项	-6 %


2 进度偏差分析

灰底=按计划应完成，蓝条=实际完成，斜纹=缺口

按工作分类

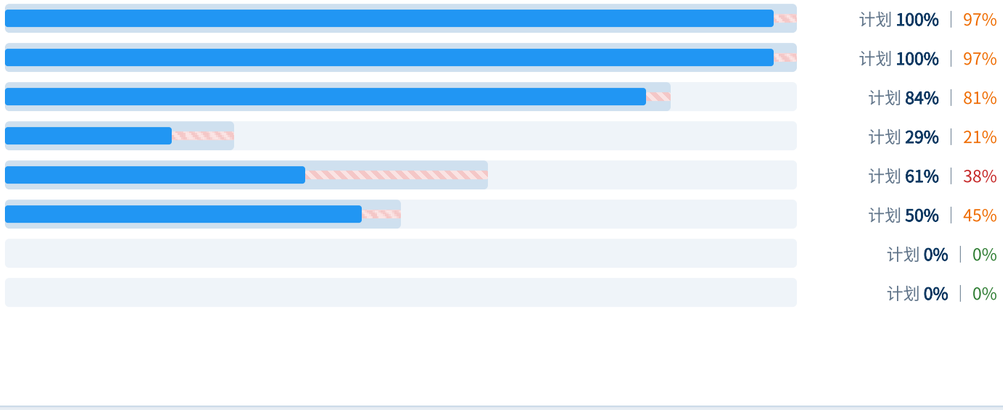

按责任组

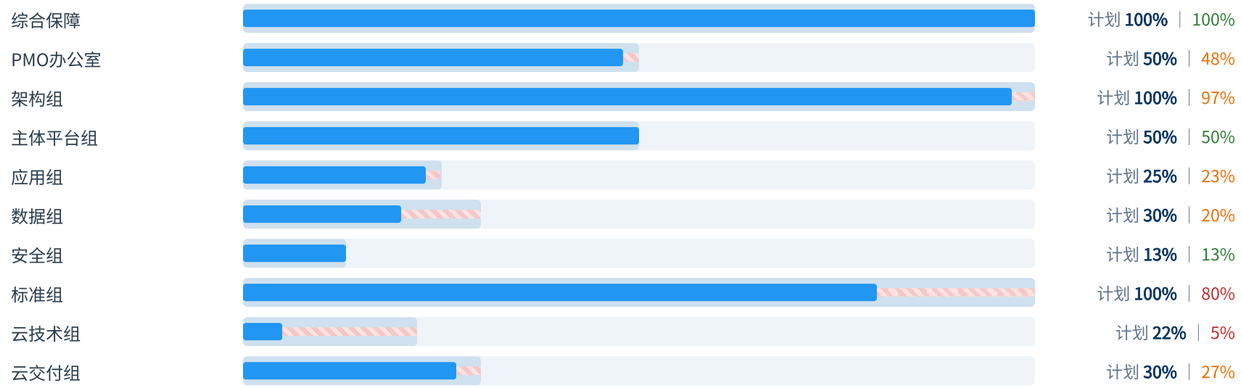

3 里程碑达成风险

按节点日期应完成的计划进度 vs 当前实际

M1 2026-12-31

年度目标节点

主体/非主体平台开发测试完成，专属云基础环境就绪，各数据资源建设达成年底成效目标

已过期 15 天

节点前应完成 10 项｜计划 100%｜实际 92%

M2 2027-02-28

系统初验

初验（含初验准备、初验会议），专属云上线验证完成、迁移方案验证完成

剩 44 天 · 滞后 8%

节点前应完成 13 项｜计划 86%｜实际 78%

M3 2027-03-31

迁移实施完成

正式迁移实施完成，双轨并行验证、第三方测评开展

剩 75 天 · 滞后 6%

节点前应完成 17 项｜计划 66%｜实际 60%

M4 2027-05-15

系统终验

终验准备、终验；原系统下线；系统试运行及功能完善完成

剩 120 天 · 滞后 5%

节点前应完成 20 项｜计划 56%｜实际 51%

M5 2027-05-31

全面推广

系统全面推广使用；标准规范贯标落地；培训推广完成

剩 136 天 · 滞后 6%

节点前应完成 39 项｜计划 39%｜实际 33%

4 系统级下钻（PMO 进度把控）

点分类展开系统，点系统展开任务，点任务看责任人与指标

层级	任务数	计划进度	实际进度	偏差	延期/预警	责任人	状态
商务推进 （工作分类）	3	100%	97%	-3	预警 2	张科、康晓宇	有预警
联合设计 （工作分类）	2	100%	97%	-3	预警 1	陈俊雄	有预警
平台建设 （工作分类）	3	84%	81%	-3	预警 2	易志伟、张权	有预警
数据资源建设 （工作分类）	17	29%	21%	-8	延期 5　预警 8	杨金伟、阿里（XXX）、纪加兴	有延期
专属云建设 （工作分类）	2	61%	38%	-23	延期 2	杨金伟、夏枭	有延期
专属云迁移 （工作分类）	3	50%	45%	-5	预警 2	曹高山	有预警
系统验证 （工作分类）	6	0%	0%	0	—	曹高山、康晓宇、阿里（XXX）、易志伟	正常
培训推广 （工作分类）	3	0%	0%	0	—	张权	正常

5 问题清单　自动生成：延期 / 预警 / 未填报 / 无系统承载

类型	任务	所属系统	责任人	计划	实际	偏差	建议动作
延期	专属云建设 专属云建设	无对应系统（缺口）	杨金伟	100%	70%	-30	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
延期	数据开放（开放库） 数据资源建设	数据开放（升级）/ 开放门户	杨金伟	25%	0%	-25	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
延期	安全保障（安全服务、三方监管、商密改造） 数据资源建设	网络和数据安全中心 / 网络安全 / 数据安全	杨金伟	25%	0%	-25	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
延期	主题库（数字经济、一人/一企、实有地址、川渝协同） 数据资源建设	数据融合分析（主题库）	杨金伟	25%	1%	-24	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
延期	高效办成一件事（政务服务） 数据资源建设	政务服务应用服务	杨金伟	25%	5%	-20	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
延期	数据采购 数据资源建设	无对应系统（缺口）	纪加兴	100%	80%	-20	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
延期	专属云安评 专属云建设	专属云基础设施	夏枭	22%	5%	-17	约谈责任人，确认是否需增派资源或调计划
预警	项目启动会 商务推进	项目管理	康晓宇	100%	98%	-2	本周内跟进，避免转为延期
预警	实施团队组建 商务推进	项目管理	康晓宇	100%	93%	-7	本周内跟进，避免转为延期
预警	总体架构及关键环节关键系统深化设计 联合设计	总体架构设计	陈俊雄	100%	93%	-7	本周内跟进，避免转为延期
预警	非主体平台开发、测试 平台建设	非主体平台（应用服务）	张权	100%	93%	-7	本周内跟进，避免转为延期
预警	平台专属云上线验证（主体+非主体） 平台建设	平台上线验证	易志伟	51%	49%	-2	本周内跟进，避免转为延期
预警	数据编目 数据资源建设	数据编目 / 数据全景地图	杨金伟	25%	19%	-6	本周内跟进，避免转为延期
无系统承载	标准规范 数据资源建设	无对应系统（缺口）	阿里（XXX）	25%	25%	0	该任务对应的平台建设内容缺失，需补建设项
无系统承载	数据采购 数据资源建设	无对应系统（缺口）	纪加兴	100%	80%	-20	该任务对应的平台建设内容缺失，需补建设项
无系统承载	专属云建设 专属云建设	无对应系统（缺口）	杨金伟	100%	70%	-30	该任务对应的平台建设内容缺失，需补建设项

6 验收成效指标看板　共 62 条运营指标，17 条主线｜点主线看明细

	运营主线	指标数	关联任务	三节点目标摘要	填报情况
▾	**数据编目**	6	2 项 · 实际 60%	实时同步国办变化，国家数据直达专区的目录实现100%对接	0/6
▾	**数据归集**	5	1 项 · 实际 13%	按需申请，通过申请的国家数据（库表、文件）实现100%归集	0/5
▾	**基础库**	5	1 项 · 实际 29%	线下安全汇聚省测绘地理信息局、自然资源厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、	0/5
▾	**主题库**	5	1 项 · 实际 1%	完成7条重点产业链主题库设计：构建重点产业链的“企业-产业链-环节-地区-行业	0/5
▾	**专题库**	4	1 项 · 实际 17%	以交易项目代码为主线组织交易全流程数据，形成覆盖进场登记、公告公示、开标评标、中	0/4
▾	**一数一源一标准**	2	1 项 · 实际 20%	累计完成高效办成一件事、五大基础库、重点场景建设相关部门500项“一数一源”数据	0/2

	运营主线	指标数	关联任务	三节点目标摘要	填报情况
▾	**数据质量**	12	1 项 · 实际 18%	数据质量达标率达到90% 数据更新率达到90% 综合质量评级≥B级（80分，参照	0/12
▾	**数据共享**	2	1 项 · 实际 24%	资源调用成功率≥90% 问题工单办结率≥80% 共享申请需求审核单按规定时间响应	0/2
▾	**数据回流**	2	1 项 · 实际 21%	国家回流需求的响应率达到100% 国家回流需求的满足率达到20%	0/2
▾	**数据开放**	1	1 项 · 实际 0%	1.数据开放目录数突破1万 2.数据开放部门覆盖数量突破40个 3.高容量开放数	0/1
▾	**数据供需**	1	1 项 · 实际 27%	围绕29个“高效办成一件事”需求形成需求清单	0/1
▾	**公共数据（数据要素市场化）**	2	1 项 · 实际 37%	形成《授权运营库数据资源清单及对接方案》1份，经实施机构确认。梳理金融服务、市	0/2
▾	**数据采购**	4	1 项 · 实际 70%	/	0/4
▾	**安全保障**	3	4 项 · 实际 30%	/	0/3
▾	**重点应用场景**	6	2 项 · 实际 58%	基于空间地理基础库数据发布二维电子地图、三维地图、地名检索、空间要素查询等4类数	0/6
▾	**高效办成一件事**	1	1 项 · 实际 5%	重点支撑29个省级主导“高效办成一件事”“四减”目标落地，经各方确认后，需四川省	0/1
▾	**标准规范**	1	1 项 · 实际 80%	配套完成数据编目、归集、治理、共享、开放、授权运营、安全管理全生命周期的系列技术	0/1

7 作战进度图

按周排布｜红色竖线=里程碑所在周

序号	任务	责任人	状态	2026年10月	11月					12月				2027年1月				2月				3月					4月				5月				
				26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31
商务推进																																		
1	合同签订	张科	正常																															
2	项目启动会	康晓宇	预警																															
3	实施团队组建	康晓宇	预警																															
联合设计																																		
4	总体架构及关键环节关键系统深化设计	陈俊雄	预警																															
5	系统间业务流转设计	陈俊雄	正常																															
平台建设																																		
6	主体平台开发、测试	易志伟	正常																															
7	非主体平台开发、测试	张权	预警																															
8	平台专属云上线验证（主体+非主体）	易志伟	预警																															
数据资源建设																																		
9	数据编目	杨金伟	预警																															
10	数据汇聚（前置库、归集库）	杨金伟	预警																															
11	一数一源一标准（清洗库）	杨金伟	预警																															
12	数据质量（清洗库）	杨金伟	预警																															

正常推进 预警 延期 已完成 本周 里程碑所在周

数据来源：项目作战图（2026-10-24）· 验收成效指标（1101-1206）· 项目组织架构

任务 39 项 · 运营指标 62 条 · 平台建设 64 项 · 周轴 32 周 · ⚠ 示例数据视图
